

企业级数据分析 Agent — MVP 开发计划


版本: v2.0 | 日期: 2026-07-01

本文档为纯项目执行跟踪，包含任务分解、工时估算和依赖关系。 产品需求见 PRD，技术方案见 RFC。

目录

- 1. 总体时间线
- 2. Phase 1: 基础框架 (Week 1-2)
- 3. Phase 2: 核心服务 (Week 3-4)
- 4. Phase 3: 知识库与解读 (Week 5-6)
- 5. Phase 4: 高级功能 (Week 7-8)
- 6. Phase 5: 管理后台 (Week 9-10)
- 7. Phase 6: 测试与优化 (Week 11-12)
- 8. 团队分工与工时汇总

1. 总体时间线

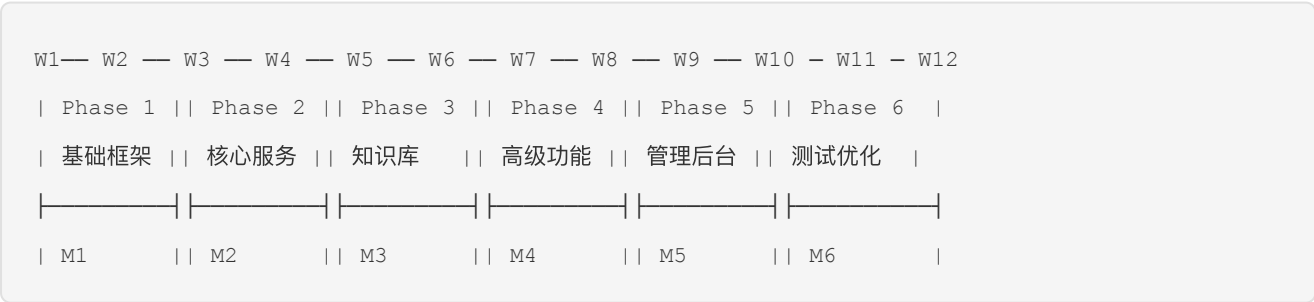

里程碑	时间	交付物
M1	Week 2	基础设施就绪
M2	Week 4	Chat 模式可用 (含消息美化渲染 + 增强提示词)
M3	Week 6	Agent 模式可用
M4	Week 8	知识库上线 + 飞书 IM 可用
M5	Week 10	管理后台完整
M6	Week 12	Alpha Release

W11-12

W9-10

W7-8

W5-6

W3-4

W1-2

M6: Alpha Release

✓ E2E Flows

✓ Perf Pass

✓ Alpha Deploy

Phase 6: Test & Optimize
Week 11-12 · 测试优化

Security
SAST Scan
Penetration

Performance
Load Testing
Optimization

Integration
E2E Tests
Playwright

Unit Tests
>70% Coverage
golangci-lint

M5: Admin Ready

✓ All Admin

✓ Dashboard

✓ Audit View

Phase 5: Admin Dashboard Week 9-10 · 管理后台

Task/KB
Task Cancel
Doc Upload

User/Perm
Role Mgmt
Model Config

Dashboard
Agent Stats
Biz Stats

Frontend
Next.js
UI Components

M4: KB Online

✓ Search

- ✓ Auto-Interpret
- ✓ Aggregation

Phase 4: Advanced Features Week 7-8 · 高级功能

Security Layer
Circuit Breaker
API Converter

Quick Prompts
Cluster+PCA
Finance Stats

Sub-Agent
A2A Protocol
Orchestrate

Scheduler
Cron Jobs
Retry


- M3: Agent MVP
- ✓ Async Tasks
 - ✓ Progress
 - ✓ Notify

Phase 3: Knowledge & Analysis Week 5-6 · 知识库与解读

Aggregation
Multi-dim
Layered

Interpretation
Knowledge+Industry
Context

Vector Index

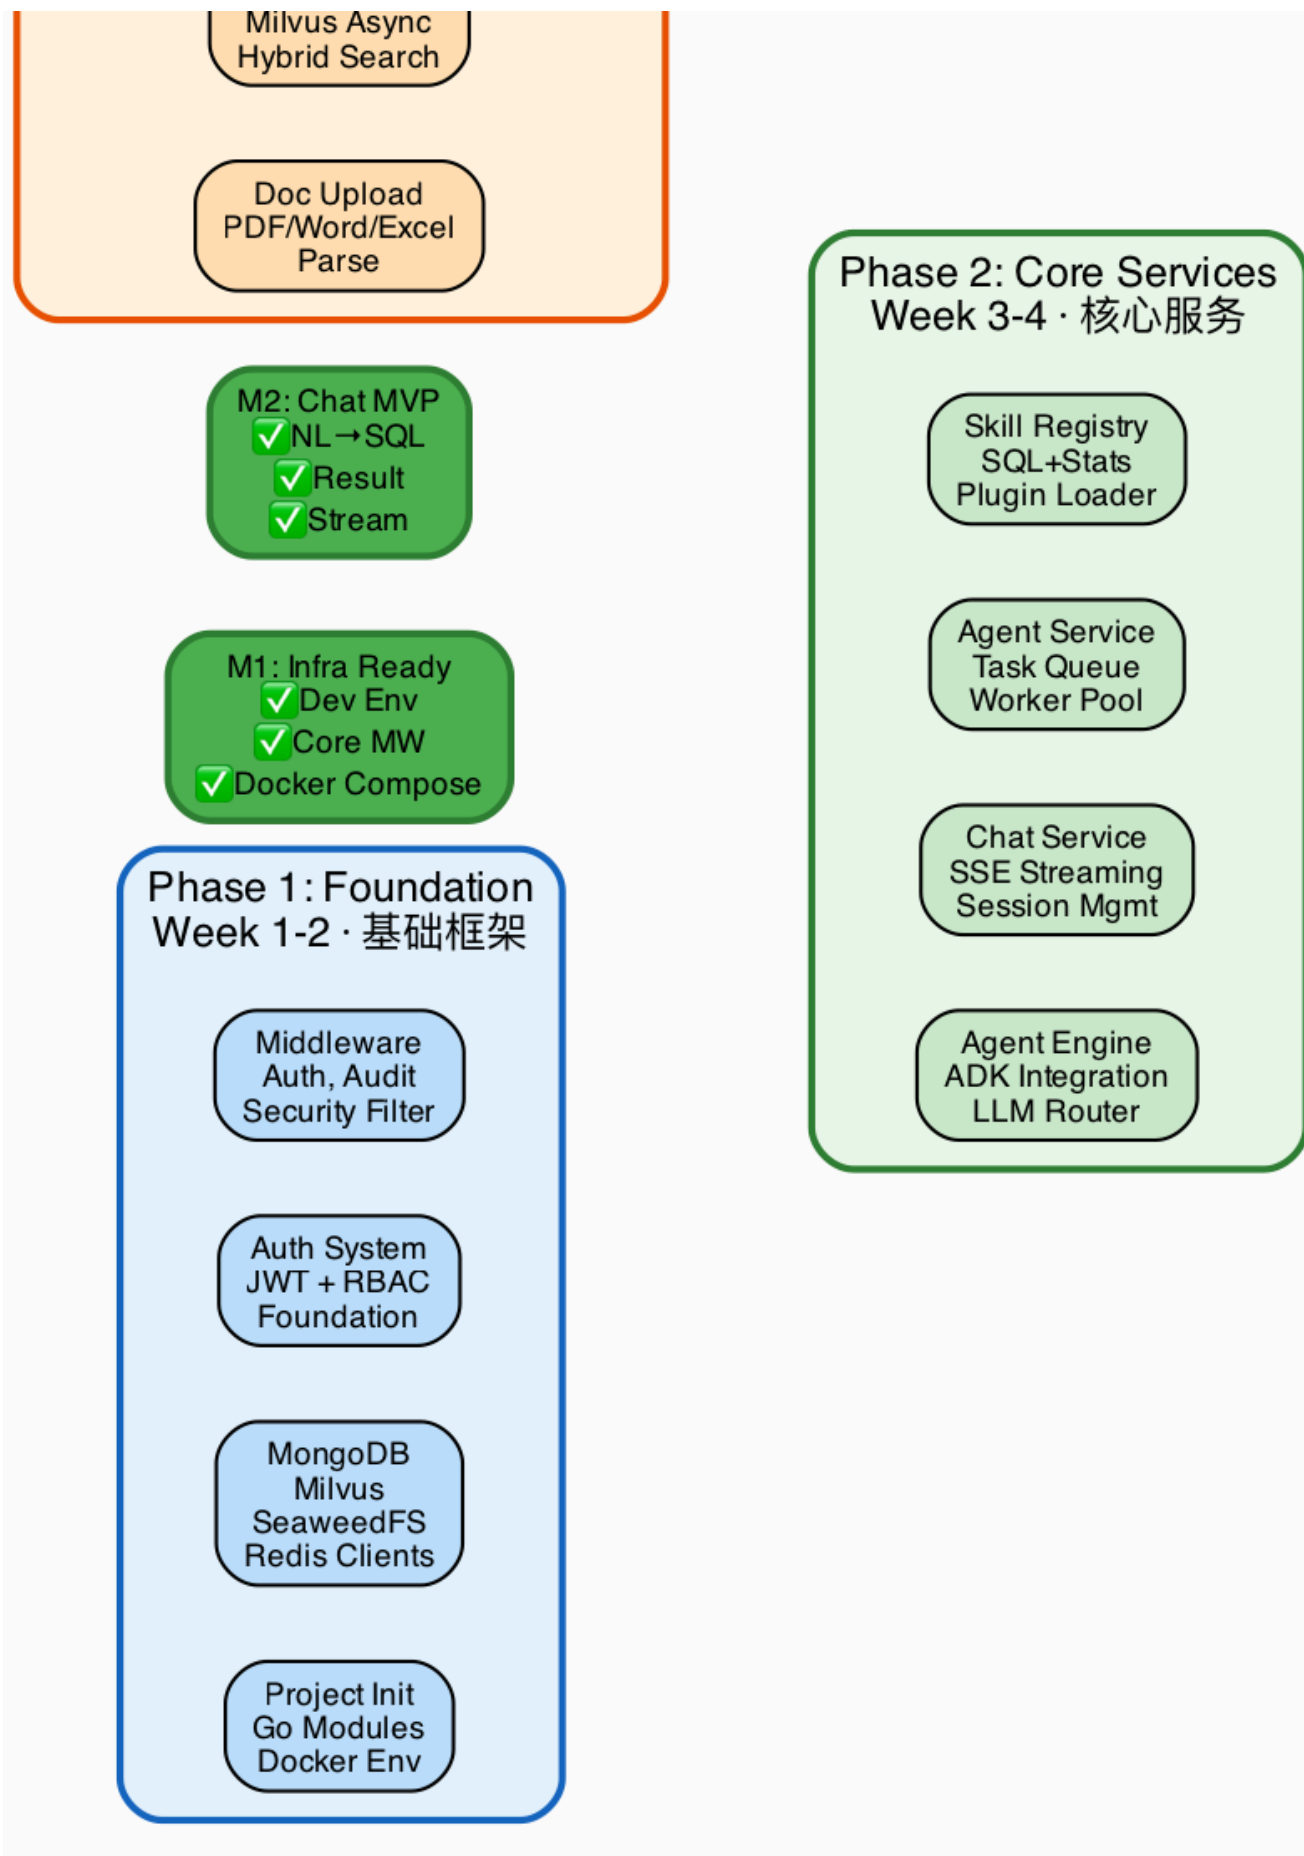

2. Phase 1: 基础框架 (Week 1–2)

Week 1: 项目初始化与基础设施

ID	任务	工时	依赖
P1-01	Go 项目初始化 (Module、目录结构、Makefile)	2h	–
P1-02	Docker Compose 开发环境 (MongoDB/Milvus/SeaweedFS/Redis)	4h	–
P1-03	配置管理系统 (Viper/YAML + 环境变量覆盖)	3h	P1-01
P1-04	统一日志系统 (slog 结构化日志)	2h	P1-01
P1-05	MongoDB 连接层 (Repository Pattern)	4h	P1-02
P1-06	Redis 连接层 (缓存 + Stream 操作)	3h	P1-02
P1-07	SeaweedFS 连接层 (Bucket CRUD + 文件操作)	3h	P1-02
P1-08	Milvus 连接层 (Collection 管理 + 向量搜索)	4h	P1-02

Week 2: 中间件与认证

ID	任务	工时	依赖
P1-09	JWT 认证中间件 (签发、验证、刷新)	4h	P1-04
P1-10	RBAC 引擎 (角色定义、权限校验)	6h	P1-05, P1-09
P1-11	HTTP 路由注册 (Gin Router + 分组)	2h	–
P1-12	审计日志中间件	3h	P1-05, P1-09
P1-13	安全过滤中间件框架	4h	P1-09
P1-14	错误码体系统一 (errcode + HTTP 映射)	2h	–
P1-15	CORS / Rate Limit 中间件	1h	–
P1-16	健康检查 API	1h	P1-05

3. Phase 2: 核心服务 (Week 3–4)

Week 3: Agent Engine + Skill Registry

ID	任务	工时	依赖
P2-01	ADK Agent Engine 初始化与配置	4h	P1-16
P2-02	LLM Router 实现（多模型切换、参数配置）	4h	P2-01
P2-03	Skill 接口定义与注册中心	4h	P2-01
P2-04	Skill 自动加载器（扫描 skills/ 目录）	3h	P2-03
P2-05	SQL Executor Skill（MCP 对接数据库）	8h	P2-03, P1-05
P2-06	Stats Engine Skill（回归 + 时间序列, gonum）	10h	P2-03
P2-07	分析结果落库模型与 Repository	3h	P1-05
P2-08	Artifact 存储（SeaweedFS + save_artifact Skill）	5h	P1-07, P2-03

Week 4: Chat Service + Agent Service

ID	任务	工时	依赖
P2-09	Session Manager（创建、续期、过期清理）	6h	P1-07
P2-10	Chat Service（SSE 流式响应）	6h	P2-01, P2-08
P2-11	快捷提示词 CRUD + 按角色展示	3h	P1-05
P2-11a	Prompt Enhancement Service（无状态，进度圈→LLM→填充输入框）	3h	P2-01
P2-11b	Vault Service（AES-256-GCM 加密 + 密钥轮转）	4h	P1-01
P2-12	Agent Task Queue（Redis Stream）	4h	P1-06
P2-13	Agent Worker Pool（并发消费任务）	6h	P2-11
P2-14	任务取消机制（Context Cancel）	3h	P2-12
P2-15	任务进度上报（WebSocket Push）	4h	P2-12
P2-16	任务完成通知（Email + In-app）	3h	P2-14

4. Phase 3: 知识库与解读 (Week 5–6)

Week 5: 知识库文档处理

ID	任务	工时	依赖
P3-01	文档解析引擎（PDF/Word/Excel/MD/TXT）	6h	–
P3-02	LLM 语义分片引擎（模型自行判断语义段落边界）	4h	P3-01, P2-01
P3-03	LLM Embedding 生成（复用当前 LLM，不引入专用向量模型）	3h	P3-02
P3-04	Milvus Collection 创建与写入（doc_id 绑定）	4h	P3-03, P1-08
P3-05	异步 Agent 索引任务（复用 Agent Task Queue）	4h	P2-12
P3-06	MongoDB 全文搜索索引建立	2h	P1-05

Week 6: 搜索 + 解读 + 聚合

ID	任务	工时	依赖
P3-07	Milvus 向量相似度搜索	3h	P3-04
P3-08	混合搜索（Semantic + Fulltext + 重排序）	5h	P3-07, P3-06
P3-09	权限过滤（搜索结果按用户权限裁剪）	3h	P3-08, P1-10
P3-10	分析结果智能解读（KB 检索 + 上下文注入）	6h	P3-08
P3-11	多维度聚合层数据定义与管理	5h	P1-05
P3-12	Email Sender Skill（域名白名单）	3h	P2-03
P3-13	知识库 Web API（上传/删除/搜索 + 索引状态 + doc_id 隔离）	4h	P3-08

5. Phase 4: 高级功能 (Week 7–8)

Week 7: 定时任务 + 子 Agent

ID	任务	工时	依赖
P4-01	Scheduler Service (robfig/cron 集成)	4h	P2-12
P4-02	定时任务 CRUD + 暂停/恢复	3h	P4-01
P4-03	定时任务执行 → 触发 Agent Service	3h	P4-01
P4-04	失败重试逻辑 + 超时终止	2h	P4-03
P4-05	Sub-Agent 编排基础 (A2A 协议)	6h	P2-01
P4-06	子 Agent 会话生命周期管理	4h	P2-08, P4-05

Week 8: 高级统计 + 安全 + OpenAPI + IM 集成

ID	任务	工时	依赖
P4-07	聚类分析 Skill (K-Means, gonum)	6h	P2-06
P4-08	主成分分析 Skill (PCA, gonum)	4h	P2-06
P4-09	财务分析 Skill (比率计算 + 趋势对比)	6h	P2-06
P4-10	Security Audit Layer 完整实现	6h	P1-13
P4-11	熔断器 Circuit Breaker	3h	P4-10
P4-12	OpenAPI → MCP 转换器	8h	P2-03
P4-13	审计日志自动清理 (TTL Index)	2h	P1-12
P4-14	用户/Agent 审计日志完善 (IP、Skill 调用)	4h	P1-12
P4-15	报告格式校验 (规则引擎 + Agent 修正循环)	6h	P1-05

Week 8 附加: IM 集成 — 飞书机器人 (MVP)

ID	任务	工时	依赖
P4-16	飞书开放平台应用创建与配置 (AppID/Secret/事件订阅/权限)	2h	–
P4-17	IM Gateway Service (Go) — 消息接收 Webhook + 签名验证	3h	P4-16
P4-18	go-lark SDK 集成 — 消息收发 (文本 + 卡片消息)	3h	P4-16
P4-19	用户绑定模块 (飞书 open_id ↔ 系统 user_id, MongoDB <code>im_bindings</code> 集合)	3h	P1-05, P4-17
P4-20	消息路由 (IM 消息 → Agent Service Chat API, 复用现有 Chat 模式)	3h	P2-10, P4-17
P4-21	分析结果卡片格式化 (表格 + 关键指标 + 图表链接, 飞书卡片 JSON 模板)	4h	P4-18, P4-20
P4-22	快捷指令支持 (/分析 /查询 /周报 /帮助)	2h	P4-20
P4-23	Agent 异步任务完成 → 飞书消息通知	2h	P2-16, P4-18
P4-24	Docker Compose 集成 (im-gateway 容器 + 健康检查)	2h	P4-17

6. Phase 5: 管理后台 (Week 9–10)

Week 9: 后台前端搭建 + 核心页面

ID	任务	工时	依赖
P5-01	Next.js 项目初始化 + UI 框架	4h	–
P5-02	Admin Layout + 菜单路由	3h	P5-01
P5-03	登录页 + JWT Token 管理	3h	P5-01
P5-04	Dashboard 可视化看板	6h	P5-02
P5-05	用户管理页面 (CRUD + 角色分配 + 启停)	5h	P5-02
P5-06	权限管理页面 (角色 CRUD + 权限映射)	4h	P5-02

Week 10: 功能页面完善

ID	任务	工时	依赖
P5-07	模型配置页面 (LLM 选择 + 参数调整)	3h	P5-02
P5-08	任务管理页面 (列表 + 进度 + 取消)	4h	P5-02
P5-09	知识库管理页 (上传 + 列表 + 搜索 + 状态追踪)	5h	P5-02
P5-10	审计日志查看页 (筛选 + 导出)	4h	P5-02
P5-11	API 转换审核页面	3h	P5-02
P5-12	消息美化渲染组件 (工具调用卡片/SQL块/表格/图表内嵌)	6h	P5-02
P5-13	增强提示词输入框 (AI Suggest 按钮 + 下拉建议面板)	3h	P5-02
P5-14	知识库索引状态展示 (pending/indexing/done/failed)	2h	P5-09
P5-15	响应式适配 (移动浏览器兼容)	3h	P5-02
P5-16	前后端联调 + Bug 修复	8h	All above

Week 10 附加: 自由探索模式 (Hermes)

ID	任务	工时	依赖
P5-17	Hermes Service (Go) 开发 — 转发层 + SSE 透传	4h	P5-02
P5-18	Hermes 容器集成 (Docker Compose + 健康检查)	3h	P5-17
P5-19	前端探索模式 UI (mode toggle + 输入转发 + 状态指示)	3h	P5-02
P5-20	MongoDB <code>hermes_sessions</code> 集合 + 查询 API	2h	P5-17

7. Phase 6: 测试与优化 (Week 11-12)

Week 11: 测试

ID	任务	工时	依赖
P6-01	单元测试补充 (目标覆盖率 > 70%)	10h	All
P6-02	集成测试 (Service 层 + 数据库交互)	8h	P6-01
P6-03	E2E 测试 (Playwright: 登录→Chat→Agent→结果)	8h	P6-02
P6-04	golangci-lint 全量检查 + 修复	4h	All
P6-05	依赖安全扫描 (govulncheck)	2h	All

Week 12: 优化 + 发布

ID	任务	工时	依赖
P6-06	性能压测 + 瓶颈优化	8h	P6-03
P6-07	安全渗透测试 (OWASP Top 10)	4h	P6-05
P6-08	Docker 镜像构建 + K8s 部署配置	4h	–
P6-09	内部 Alpha 发布 + 使用培训	4h	P6-08
P6-10	文档整理 (API 文档 + 部署手册 + 用户指南)	6h	All

8. 团队分工与工时汇总

团队配置

角色	人数	职责
后端工程师	2	核心服务开发 + AI 代码 Review
全栈/前端	1	管理后台前端 + API 联调
AI/架构师	1 (兼职)	架构决策 + Agent Prompt 设计 + 技术评审

按阶段分配

Phase	后端	前端	关键产出
P1 (W1-2)	2	1 (预研)	基础设施 + 中间件
P2 (W3-4)	2	1 (原型)	Agent Engine + Chat/Agent
P3 (W5-6)	2	-	知识库 + 解读 + 聚合
P4 (W7-8)	2	1 (IM联调)	高级功能 + 安全 + 飞书IM
P5 (W9-10)	1	1 (全力)	管理后台
P6 (W11-12)	2	1	测试 + 调优 + 发布

工时汇总

Phase	预估工时
Phase 1	~45h
Phase 2	~73h
Phase 3	~55h
Phase 4	~85h
Phase 5	~64h
Phase 6	~56h
总计	~378h
